



**ARCHAIA Brno z.ú.**

Bezručova 78/15, 602 00 Brno

IČ: 26268469; DIČ: CZ26268469

bankovní spojení: FIO, č.ú.: 290 148 2974/2010

Číslo jednací: 9/25

vyřizuje: M. Peška, tel: 777 239 045

## **Návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbě: „Žďár nad Sázavou - tvrz“**

Práce lze rozdělit do tří etap či úseků:

### **Etapa I (2-3 týdny)**

Jedná se o prostor kolem kostela sv. Prokopa, kaple sv. Barbory a komunikaci mezi ulicemi Veselská a Radniční. Prostor bude zkoumán následovně:

- 1) po základní skrývce drnu proběhne detektorová prospekce po níž bude následovat další skrývka na pláň cca 0,5 m pod současný terén. Pokud zde budou zachyceny ojedinělé hroby, tak budou ponechány na vyvýšeném soklu. Nedávno provedenými sondami při kostele sv. Prokopa se do úrovně cca 0,4 m pod terénem nacházely pouze dislokované kosti. Hroby se dle sondy při kapli sv. Barbory mohou vyskytovat především od úrovně 0,7 m pod současným terénem.
- 2) Následovat bude detektorová prospekce a dozkoumání ojedinělých hrobů.
- 3) Dále budou zkoumány hrobové situace v prostoru budoucí kašny a jejího přívodu vody a odtoku vodu. Pokud hřbitov zasahoval pod příjezdovou komunikaci směrem k faře a domu Veselská č. 2/13, tak budou zkoumány hroby ve stavbou snížené části hřbitovního areálu při kapli sv. Barbory.



Umístění sondy při kapli sv. Barbory



Profil sondou – v hloubce cca 0,7 m se nachází hrob orientovaný nohama směrem ke kostelu

## **Etapa II (8 týdnů)**

Etapa II bude zahájena pouze v případě, že bude z hlediska stavby nezbytné sanovat podkladovou vrstvu nově budovaných komunikací při kostele resp. po nevyhovujících zkouškách únosnosti. Jednalo by se o cca 2 až 3 měsíce práce na středověkém hřbitově, který se nacházel při kostele sv. Prokopa a zasahoval místy pravděpodobně i pod spojující komunikaci mezi ulicemi Radnická a Veselská. Vzhledem k velikosti prostoru a našim zkušenostem odhadujeme počet zkoumaných hrobů orientačně na 500. Z pohledu stavby a objednatele by bylo vhodné této situaci předejít.

## **Etapa III (6 týdnů)**

Jedná se prostor Tvrze při současném regionálním muzeu. Zkoumána by měla být celá plocha až na koridor mezi Moučkovým domem a muzeem. Sondou při muzeu byly archeologické situace zachyceny až do hloubky přesahující 1,7 m. V rámci ZAV by byly zkoumány výkopy nové kanalizace a vodovodu a lokálně i dochovaná archeologická souvrství. Vzhledem k množství starších inženýrských sítí a nutnosti přístupu k domům by uvedená fáze trvala cca 6 týdnů.




Umístění sondy před regionálním muzeem.



Profil sondy při muzeu – pod současnou dlažbou začíná archeologický terén, cca v hloubce cca 0,4 m byla zachycena starší konstrukce či destrukce.

#### **Etapa IV (2 týdny)**

Jednalo by se o dozkoumání koridoru mezi Moučkovým domem a muzeem. Případně mohou být etapy III a IV sloučeny dohromady.

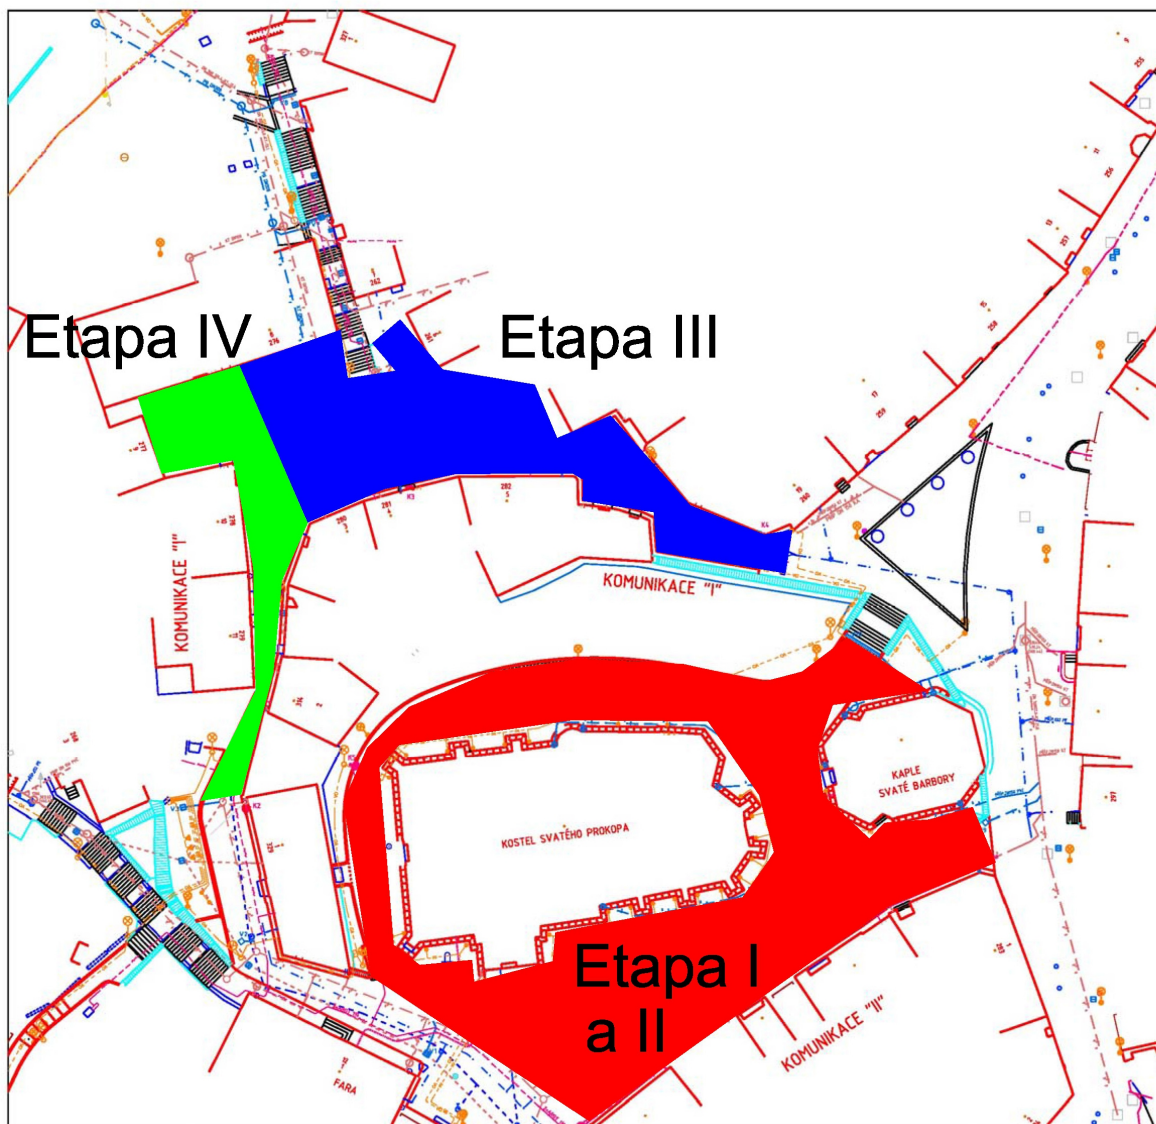

Situace jednotlivých ploch v rámci katastrální mapy.

v Brně 4. února 2025

Mgr. Pavel Staněk  
Mgr. Marek Peška, Ph.D.  
Archaia Brno z.ú.
